

Low-code – первый тайм мы уже отыграли

Геннадий Гребеник

ФОРАБАНК




31 год на рынке

7 регионов России

143 офисов

85 Место по Активам

МИДЛ

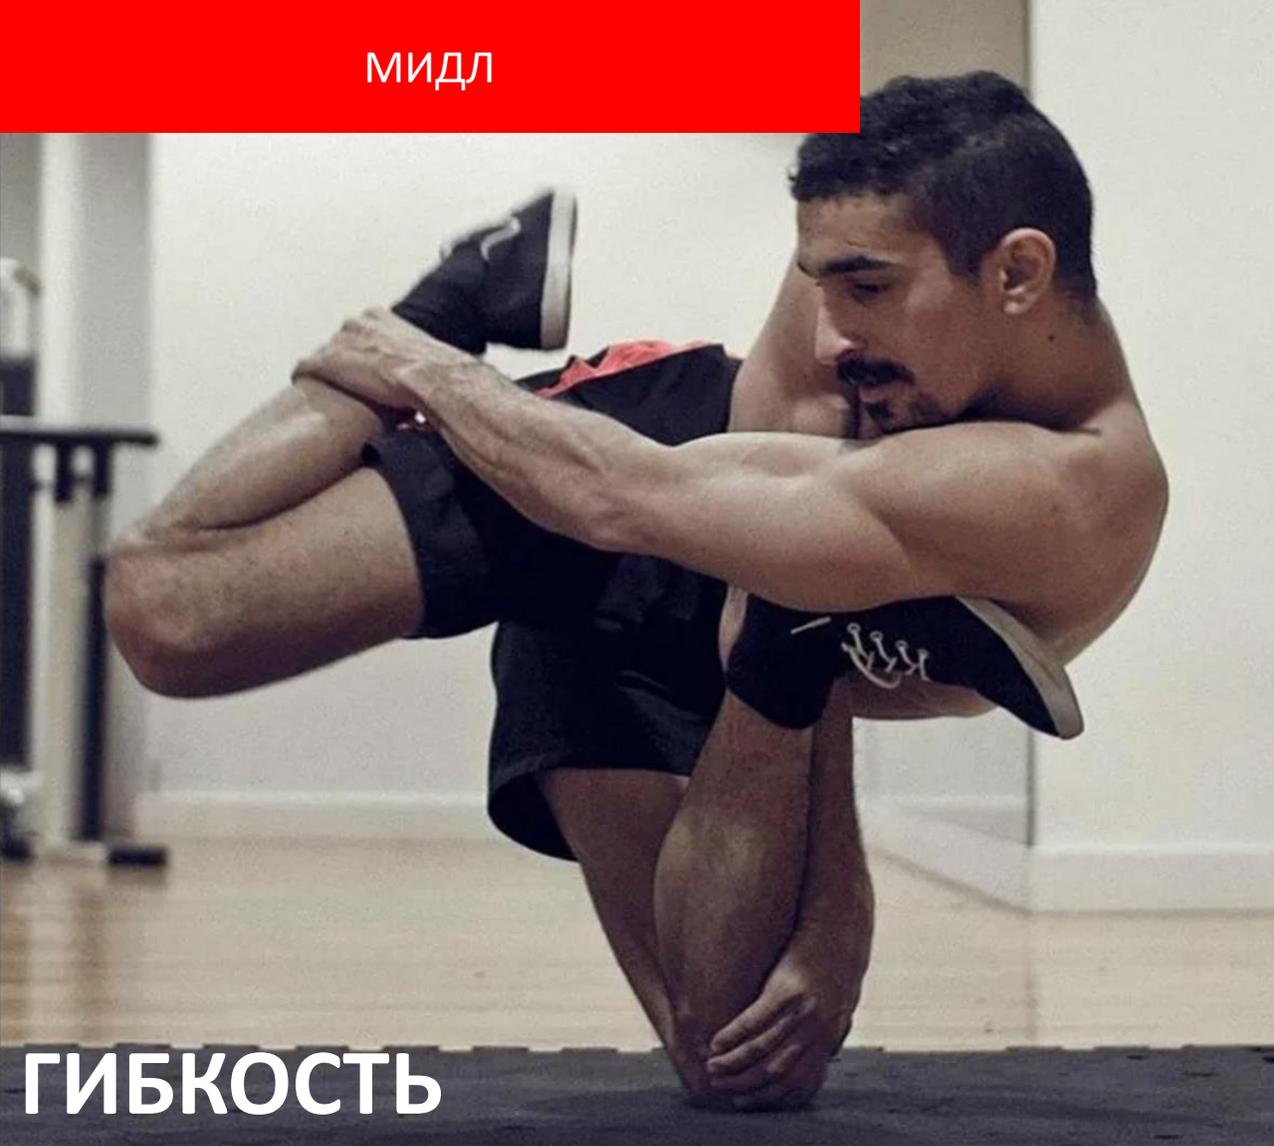

ГИБКОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ БАНКА

КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

СВОЯ РАЗРАБОТКА

КОРОБКА С СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКОЙ

LOW CODE ПЛАТФОРМА





КОНСТРУКТОР ЭКРАННЫХ ФОРМ И КОМПОНЕНТ

АВТОГЕНЕРАЦИЯ КОДА

УСКОРЕНИЕ СБОРКИ И ТЕСТИРВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ РАЗРАБОТКИ



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ МИДЛ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПОСТРОЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ БИЗНЕС КОМПОНЕНТ

ЕДИНЫЙ ГЛОСАРИЙ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗРАБОТКИ



Конвейер Банковских карт



Конвейер открытия счетов


Конвейер кредитов ЮЛ

Конвейер кредитов ФЛ


Конвейер Гарантий

Инасайд


Ожидание

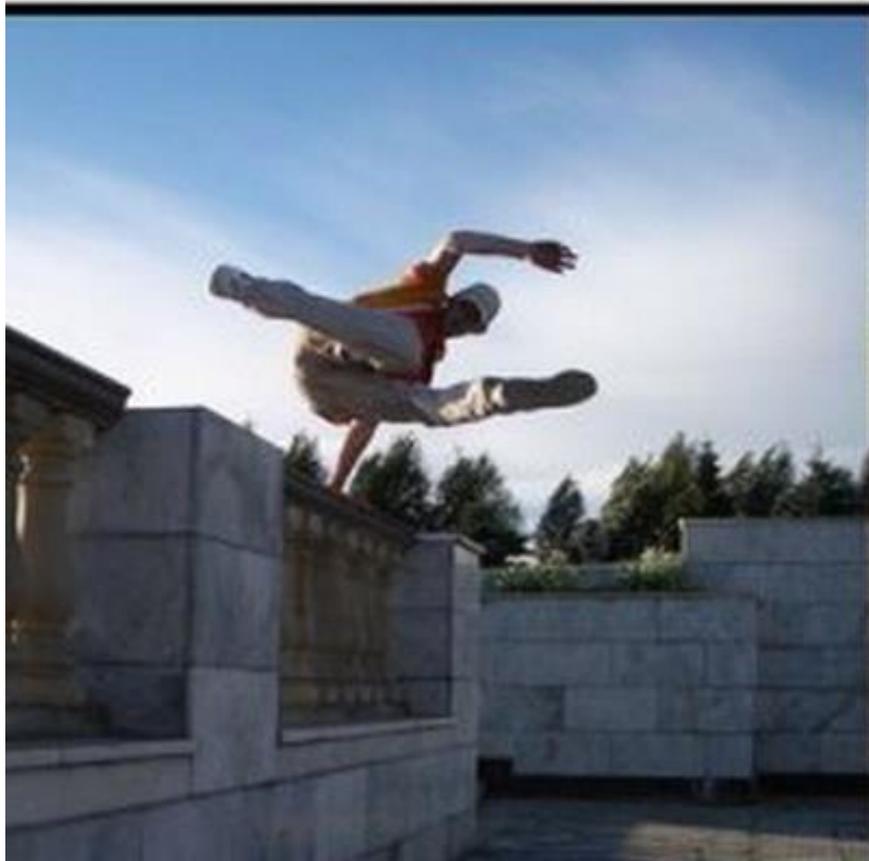


Реальность

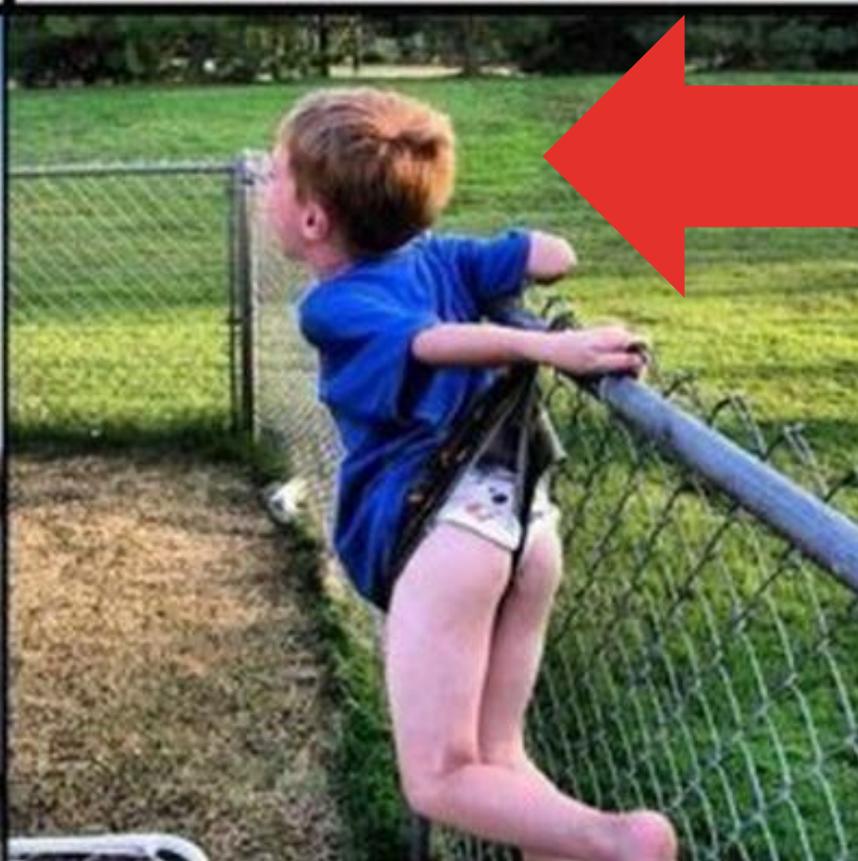

Конвейер Банковских карт

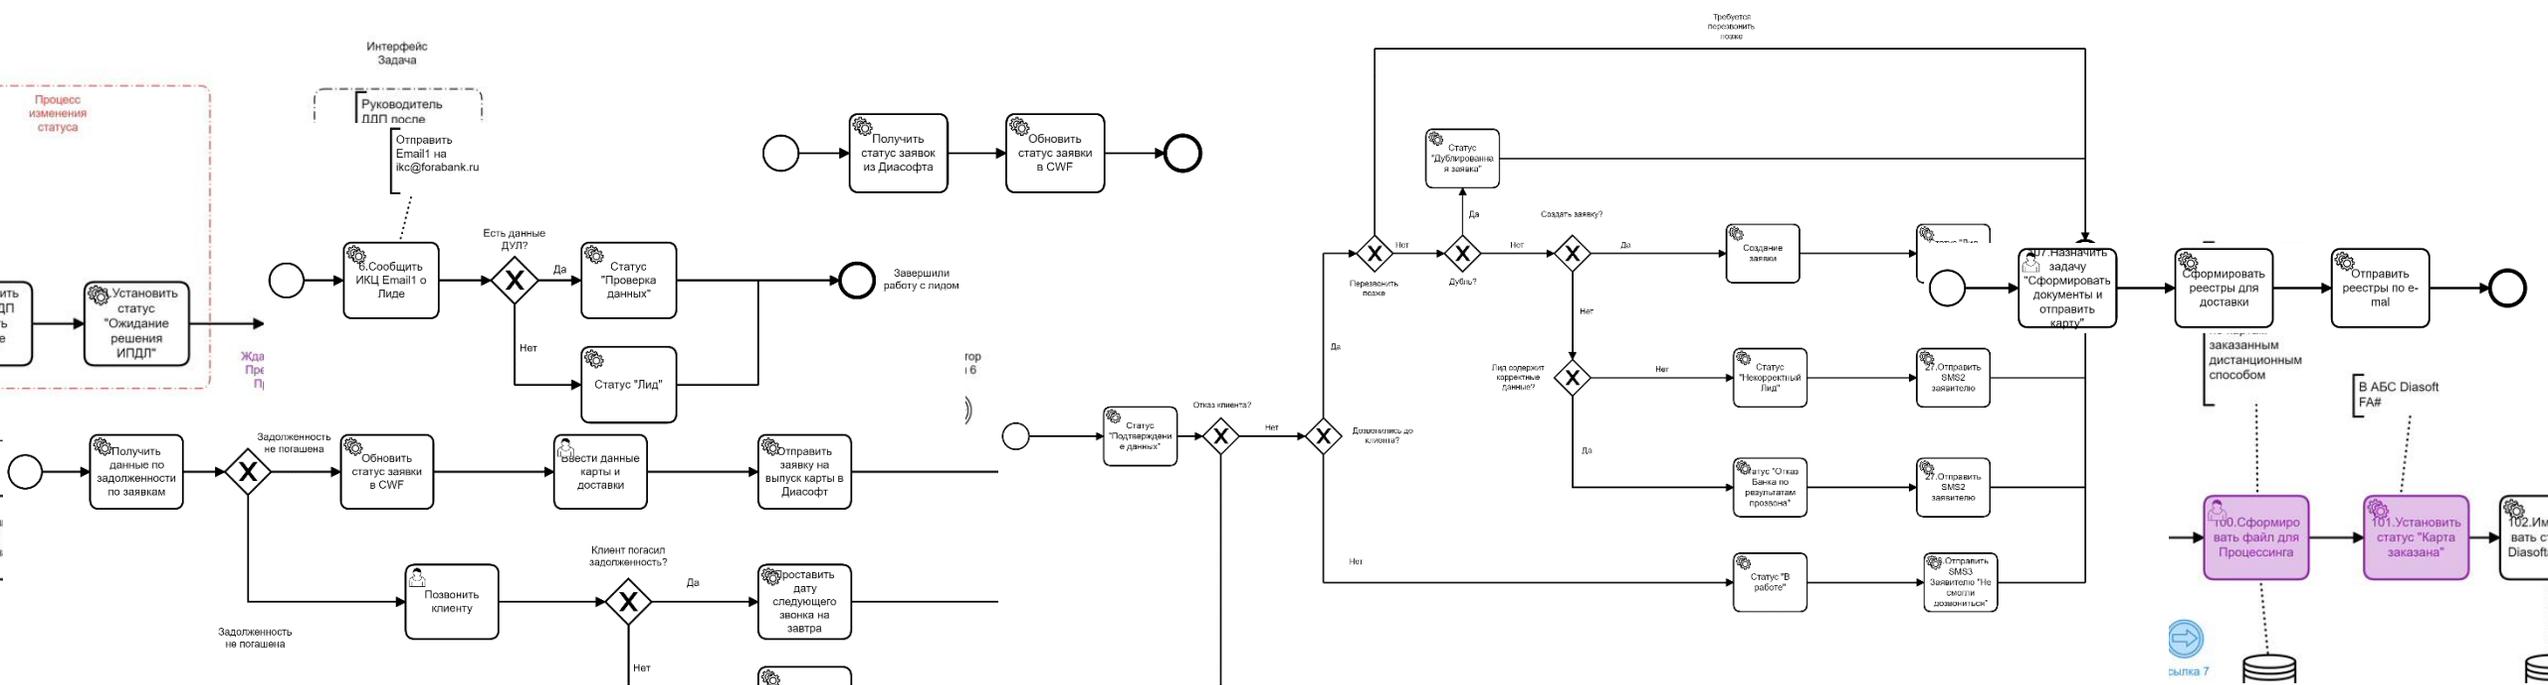

ДЕКОМПОЗИЦИЯ И РАЗБИЕНИЕ ПРОЦЕССА НА БИЗНЕС ФУНКЦИИ

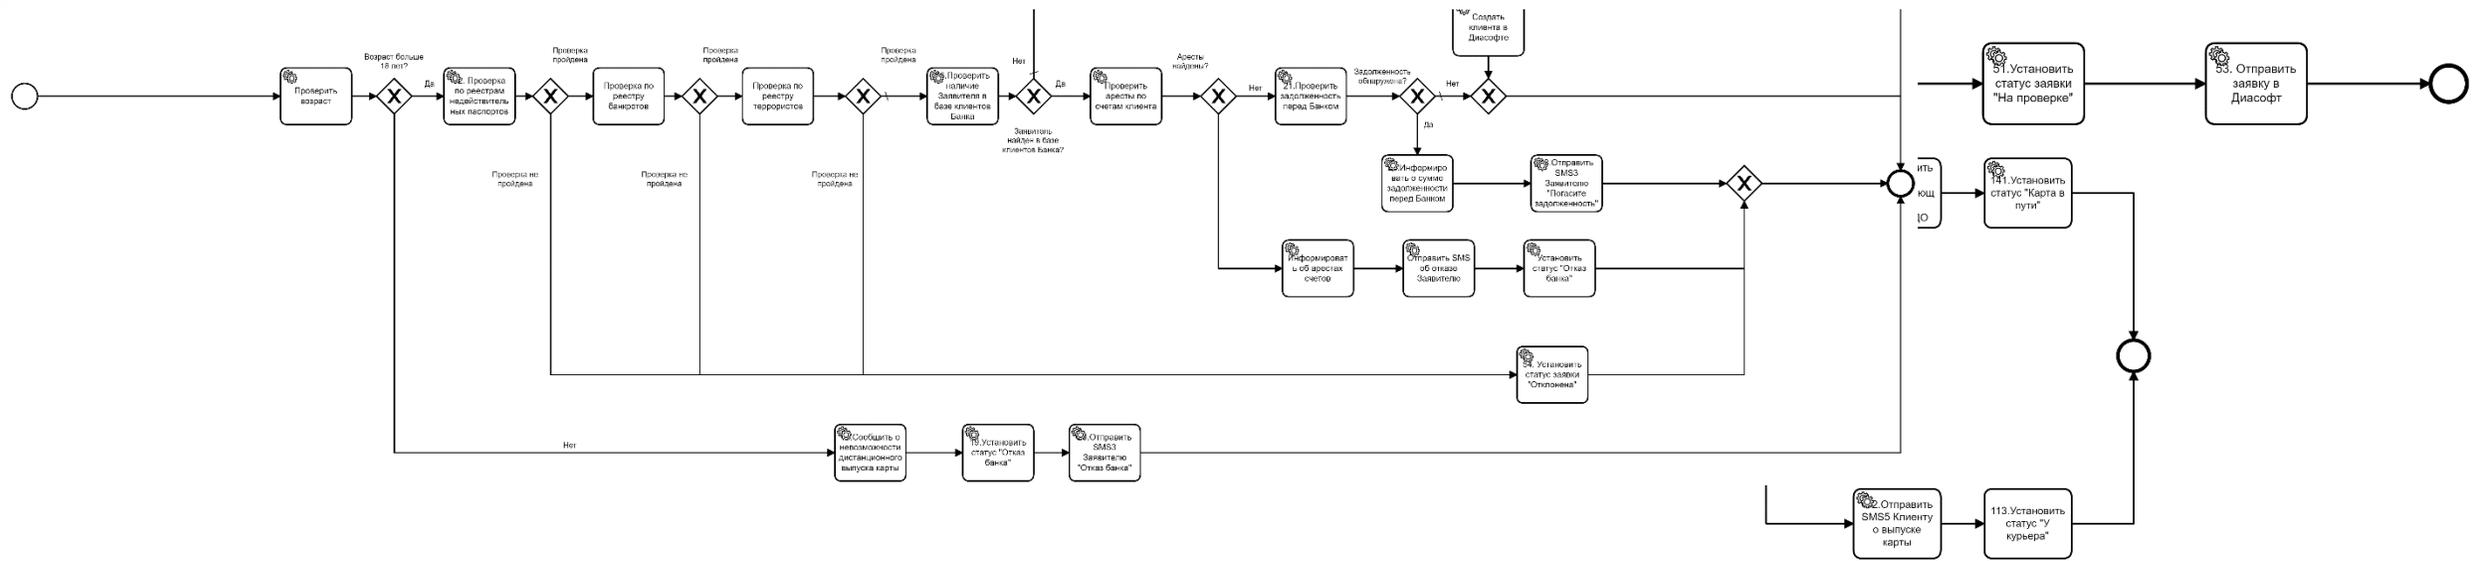





Конвейер Банковских карт

6+4 КОМАНДА

6 МЕСЯЦЕВ РАЗРАБОТКА

5 МЕСЯЦА ОТЛАДКА

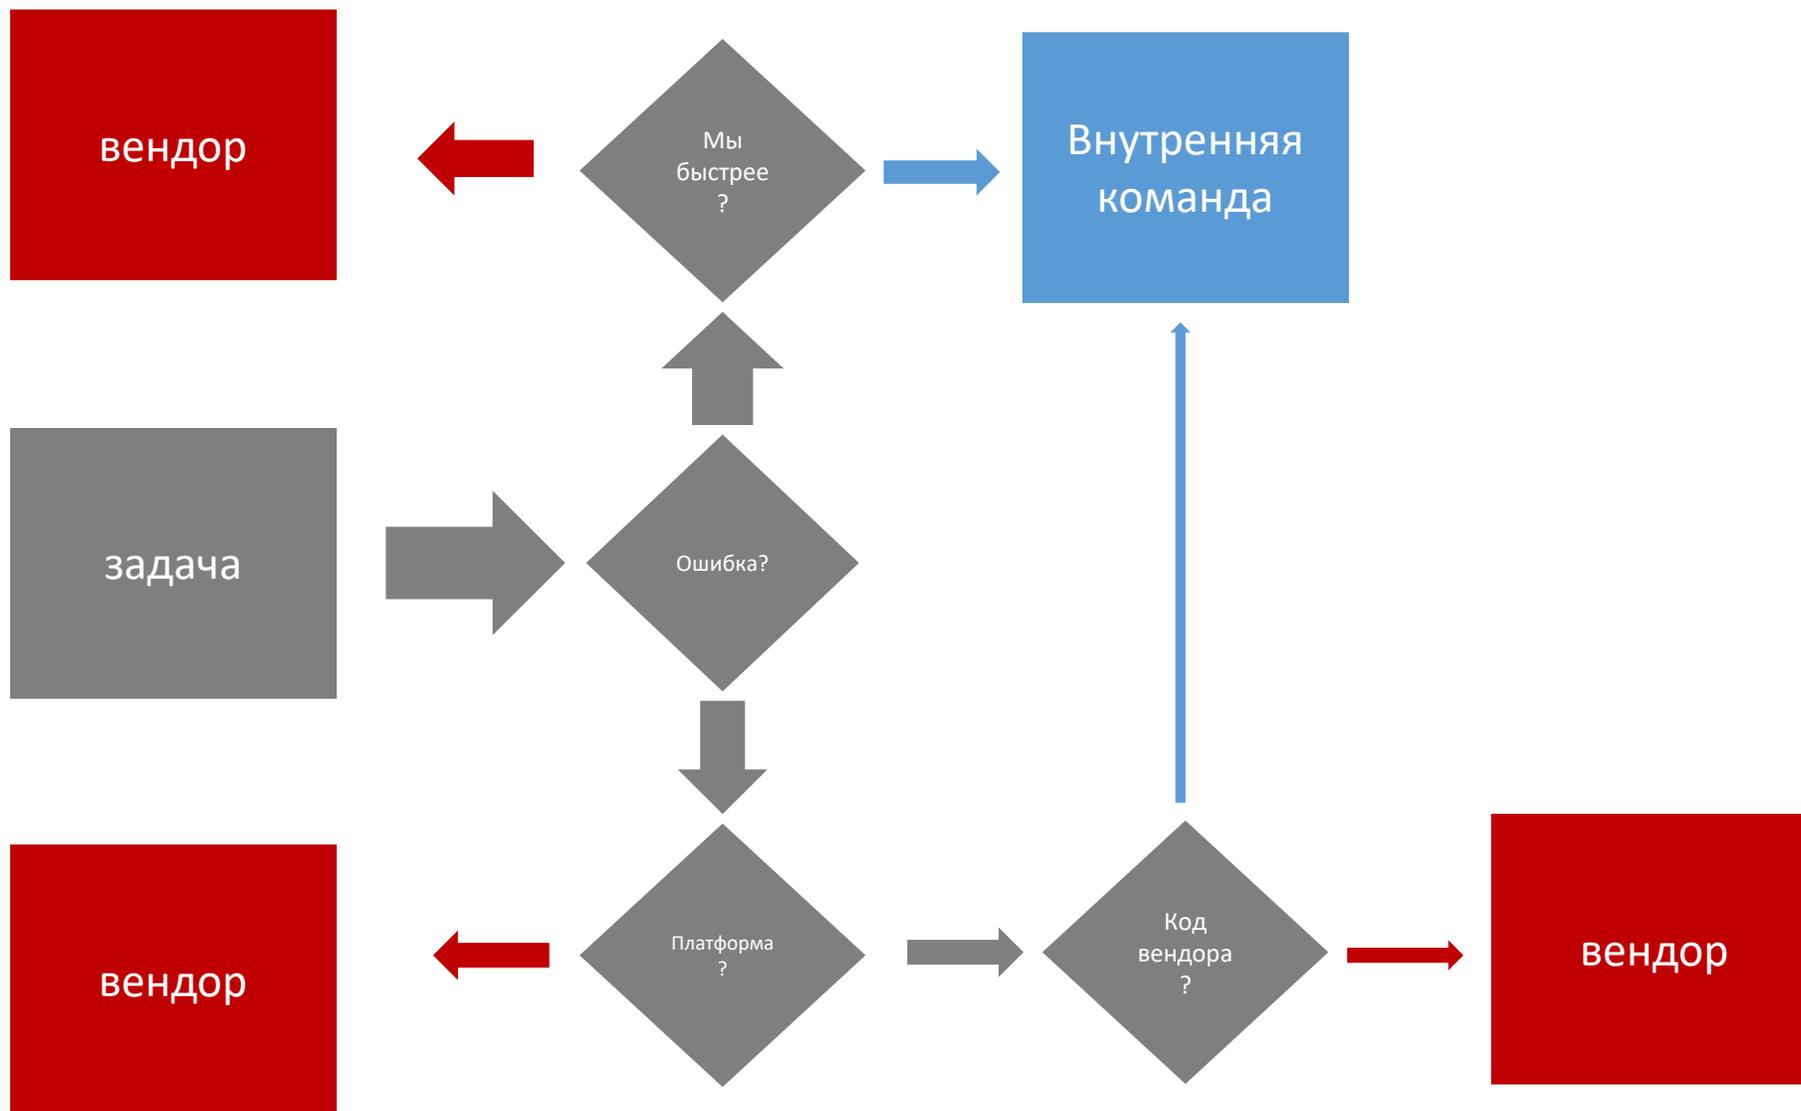

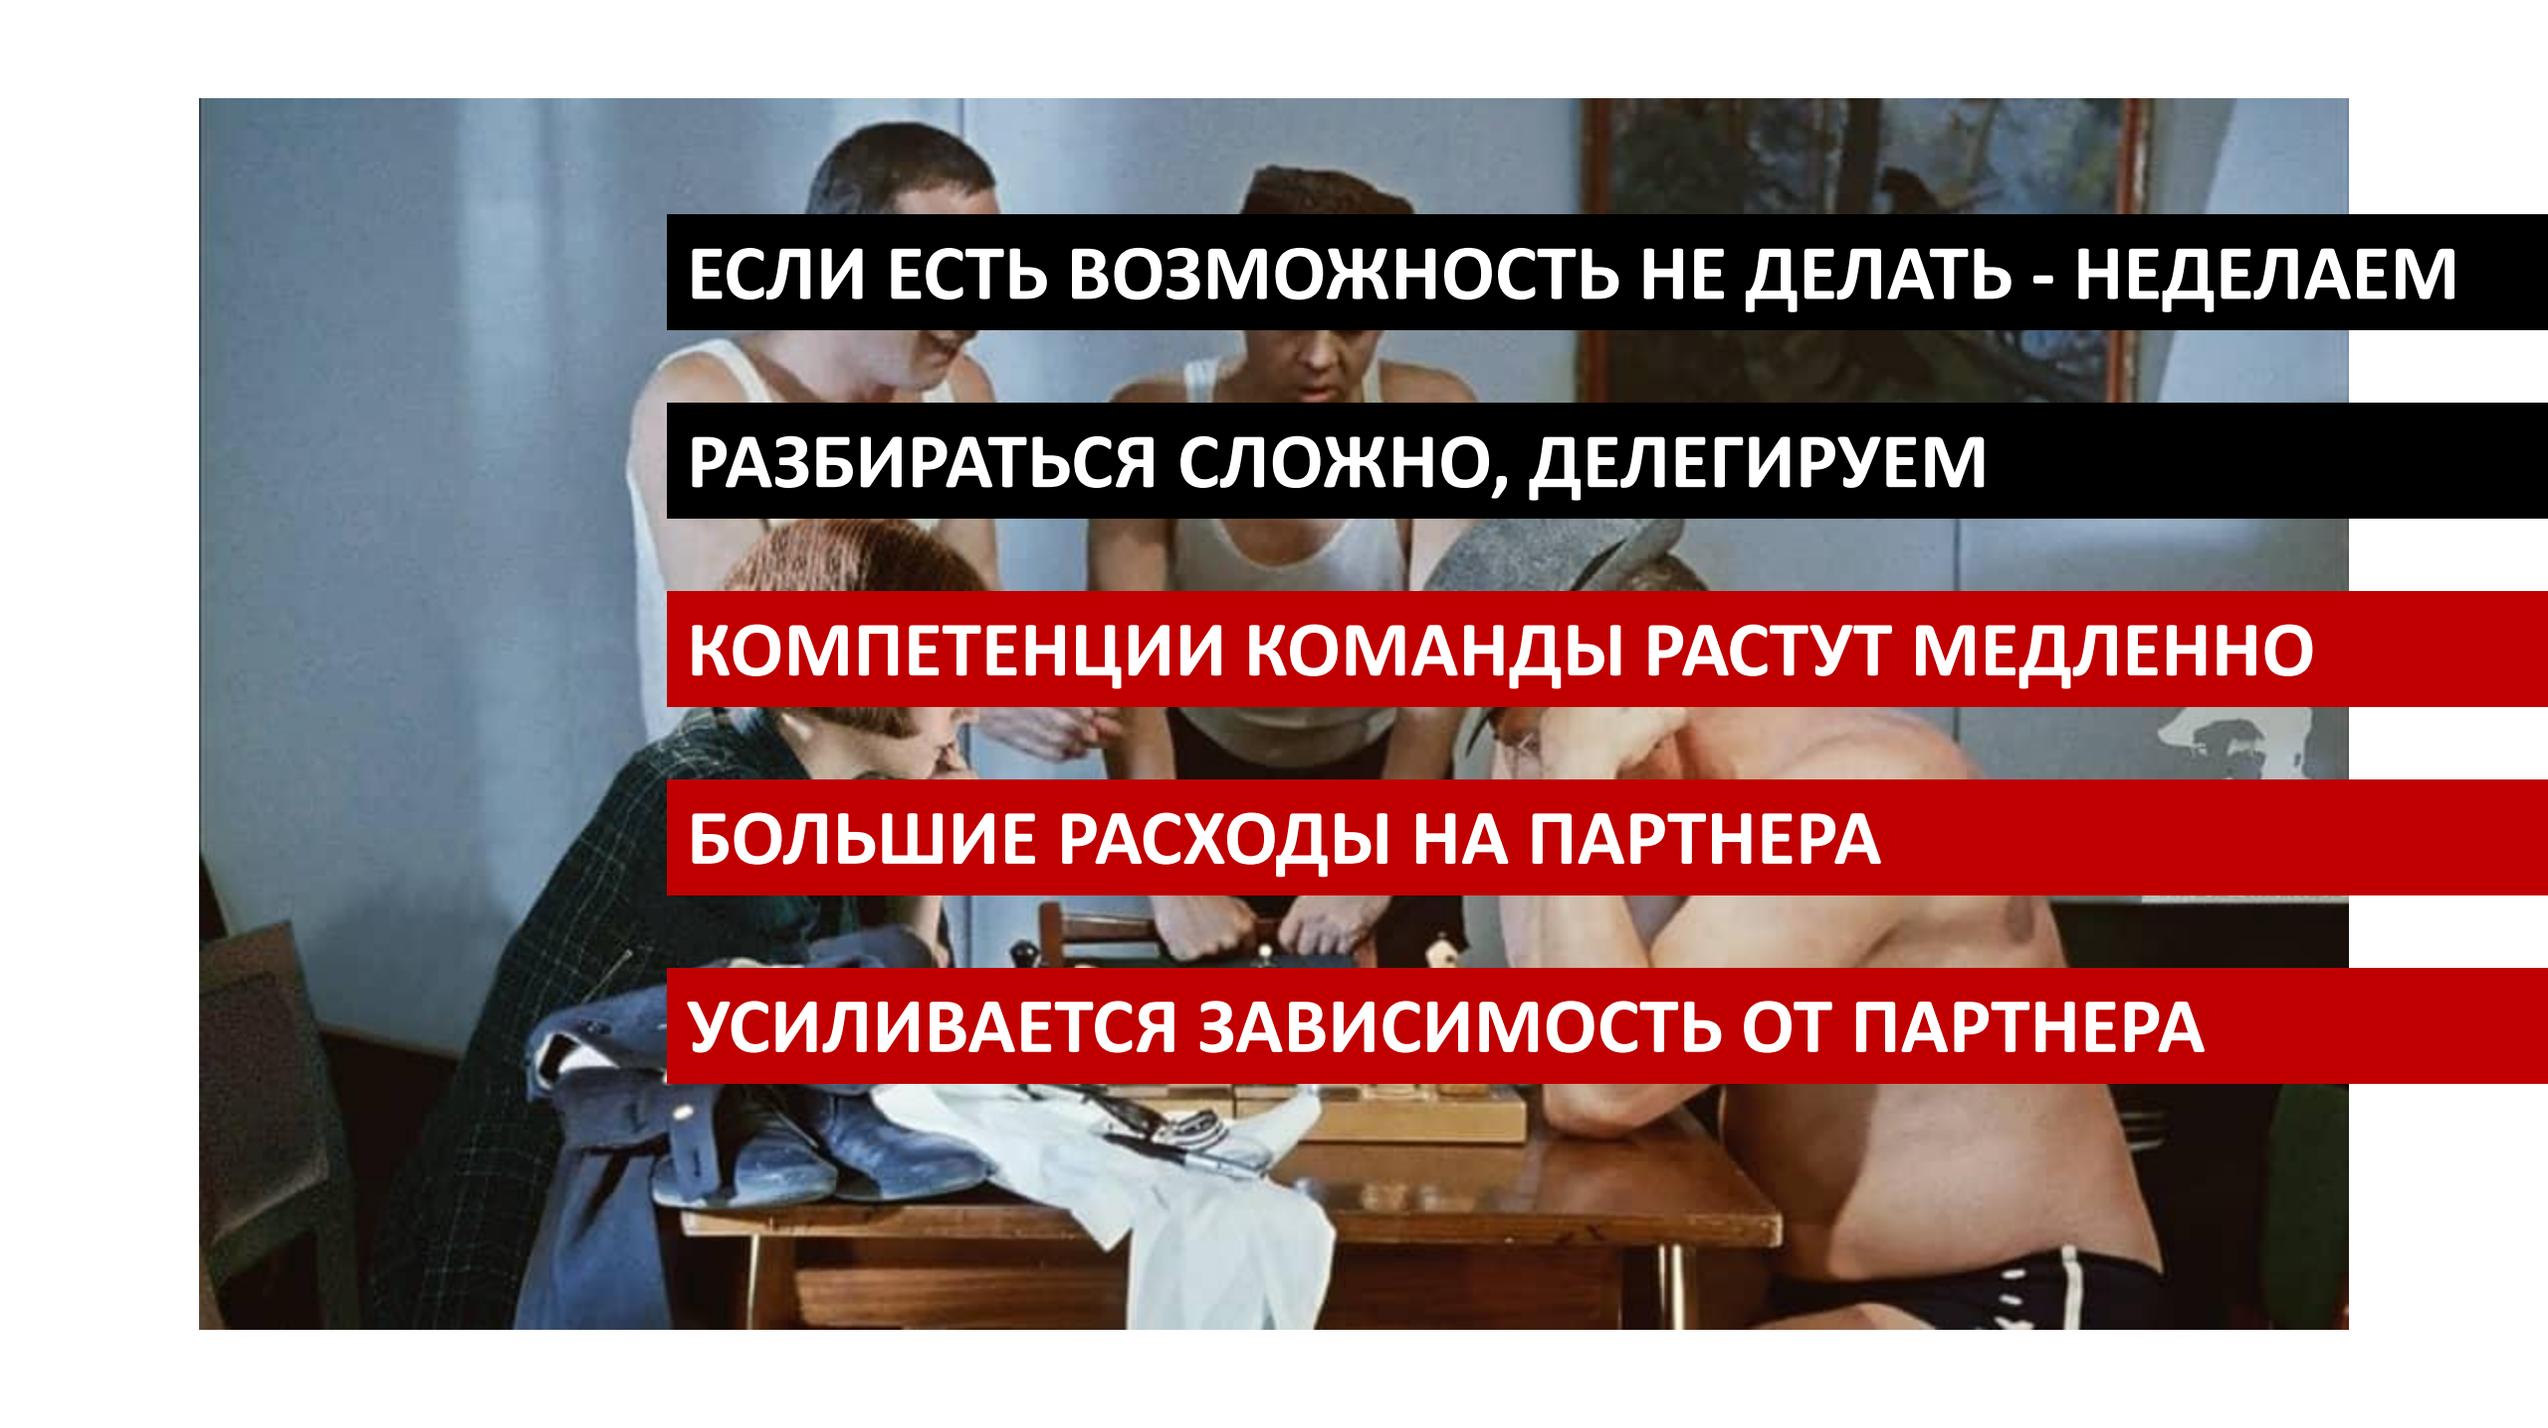A photograph of a group of people in a room, possibly a workshop or office. There are several people, some wearing white tank tops, gathered around a table. The scene is overlaid with five horizontal text bars. The first two bars are black with white text, and the last three are red with white text. The background shows a window with a view of trees and a painting on the wall.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ДЕЛАТЬ - НЕДЕЛАЕМ

РАЗБИРАТЬСЯ СЛОЖНО, ДЕЛЕГИРУЕМ

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ РАСТУТ МЕДЛЕННО

БОЛЬШИЕ РАСХОДЫ НА ПАРТНЕРА

УСИЛИВАЕТСЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАРТНЕРА

**ПЕРВОЕ ВНЕДРЕНИЕ СОИЗМЕРИМО С
РАЗРАБОТКОЙ С «0»**



АДАПТАЦИЯ КОНСТРУКТОРА



ИНТЕГРАЦИЯ



СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ КОПОНЕНТОВ

СЛАБАЯ ВНУТРЕННЯЯ КОМАНДА



НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПЛАТФОРМЫ



Что поменять?


НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПЛАТФОРМЫ

ПОСТОЯННОЕ РЕГРЕССИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ИТАРАЦИОННОЕ ВЫЧИЩЕНИЕ КОСТЫЛЕЙ И ЗАПЛАТОК

МИНИМИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДОВ С ВЕРСИИ НА ВЕРСИЮ

ПОСТОЯННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ПОСТАВЩИКА

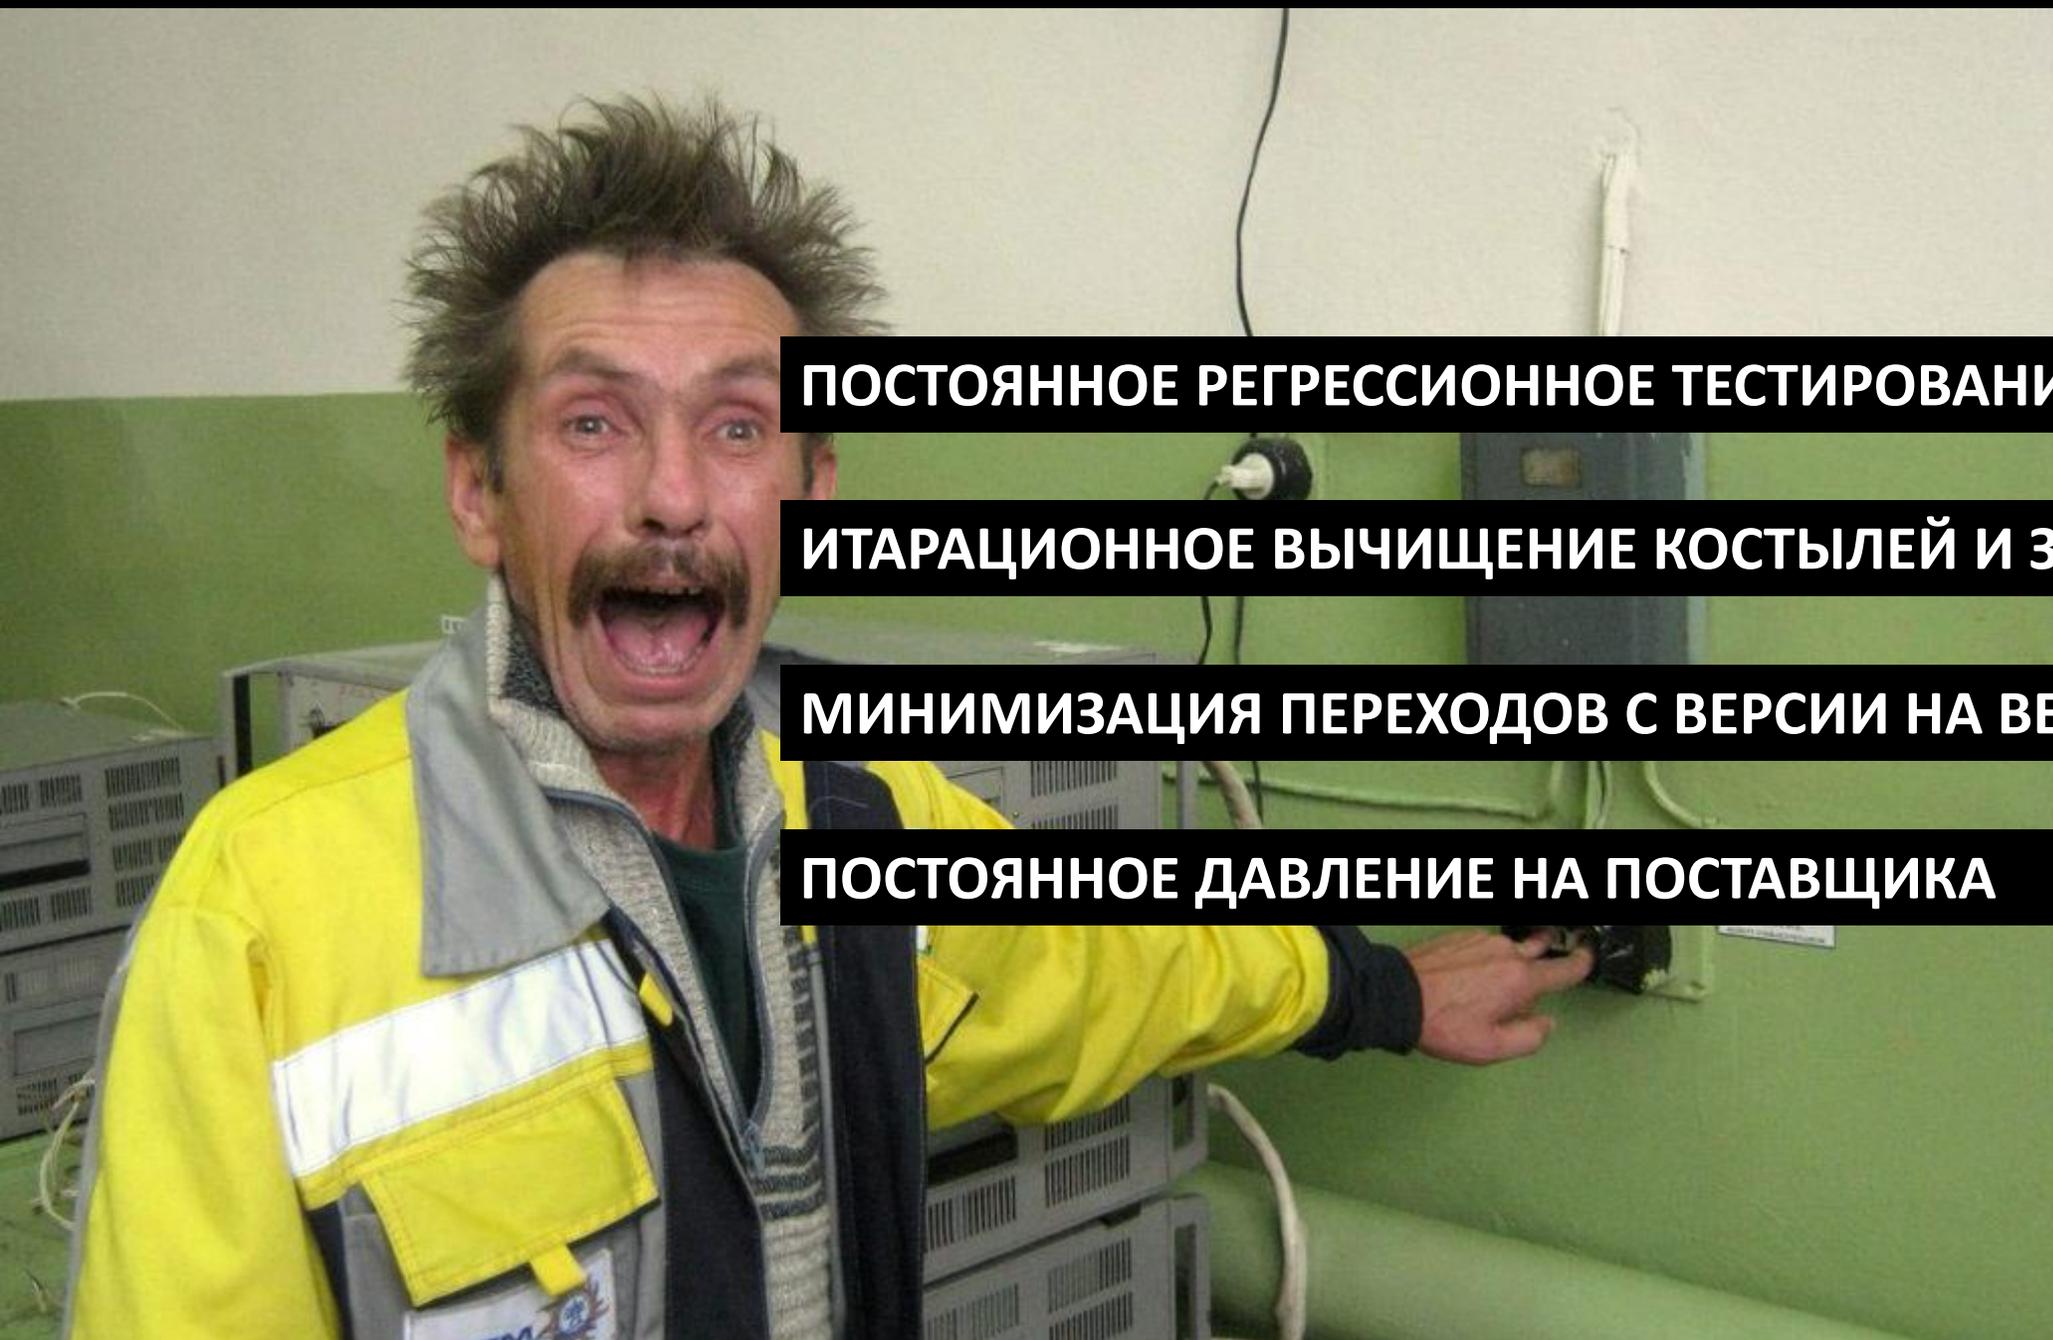

НЕДООЦЕНКА ОБЪЕМА ЗАДАЧИ



ПРИНЯТЬ КАК ОПЫТ

СЛАБАЯ СОБСТВЕННАЯ КОМАНДА

УКРЕПЛЕНИЕ КОМАНДЫ middle СПЕЦИАЛИСТАМИ

ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАРТНЕРА

ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ






Конвейер открытия счетов


4+6 КОМАНДА

8 МЕСЯЦЕВ РАЗРАБОТКА

8 МЕСЯЦА ОТЛАДКА

Жесткий архитектурный контроль

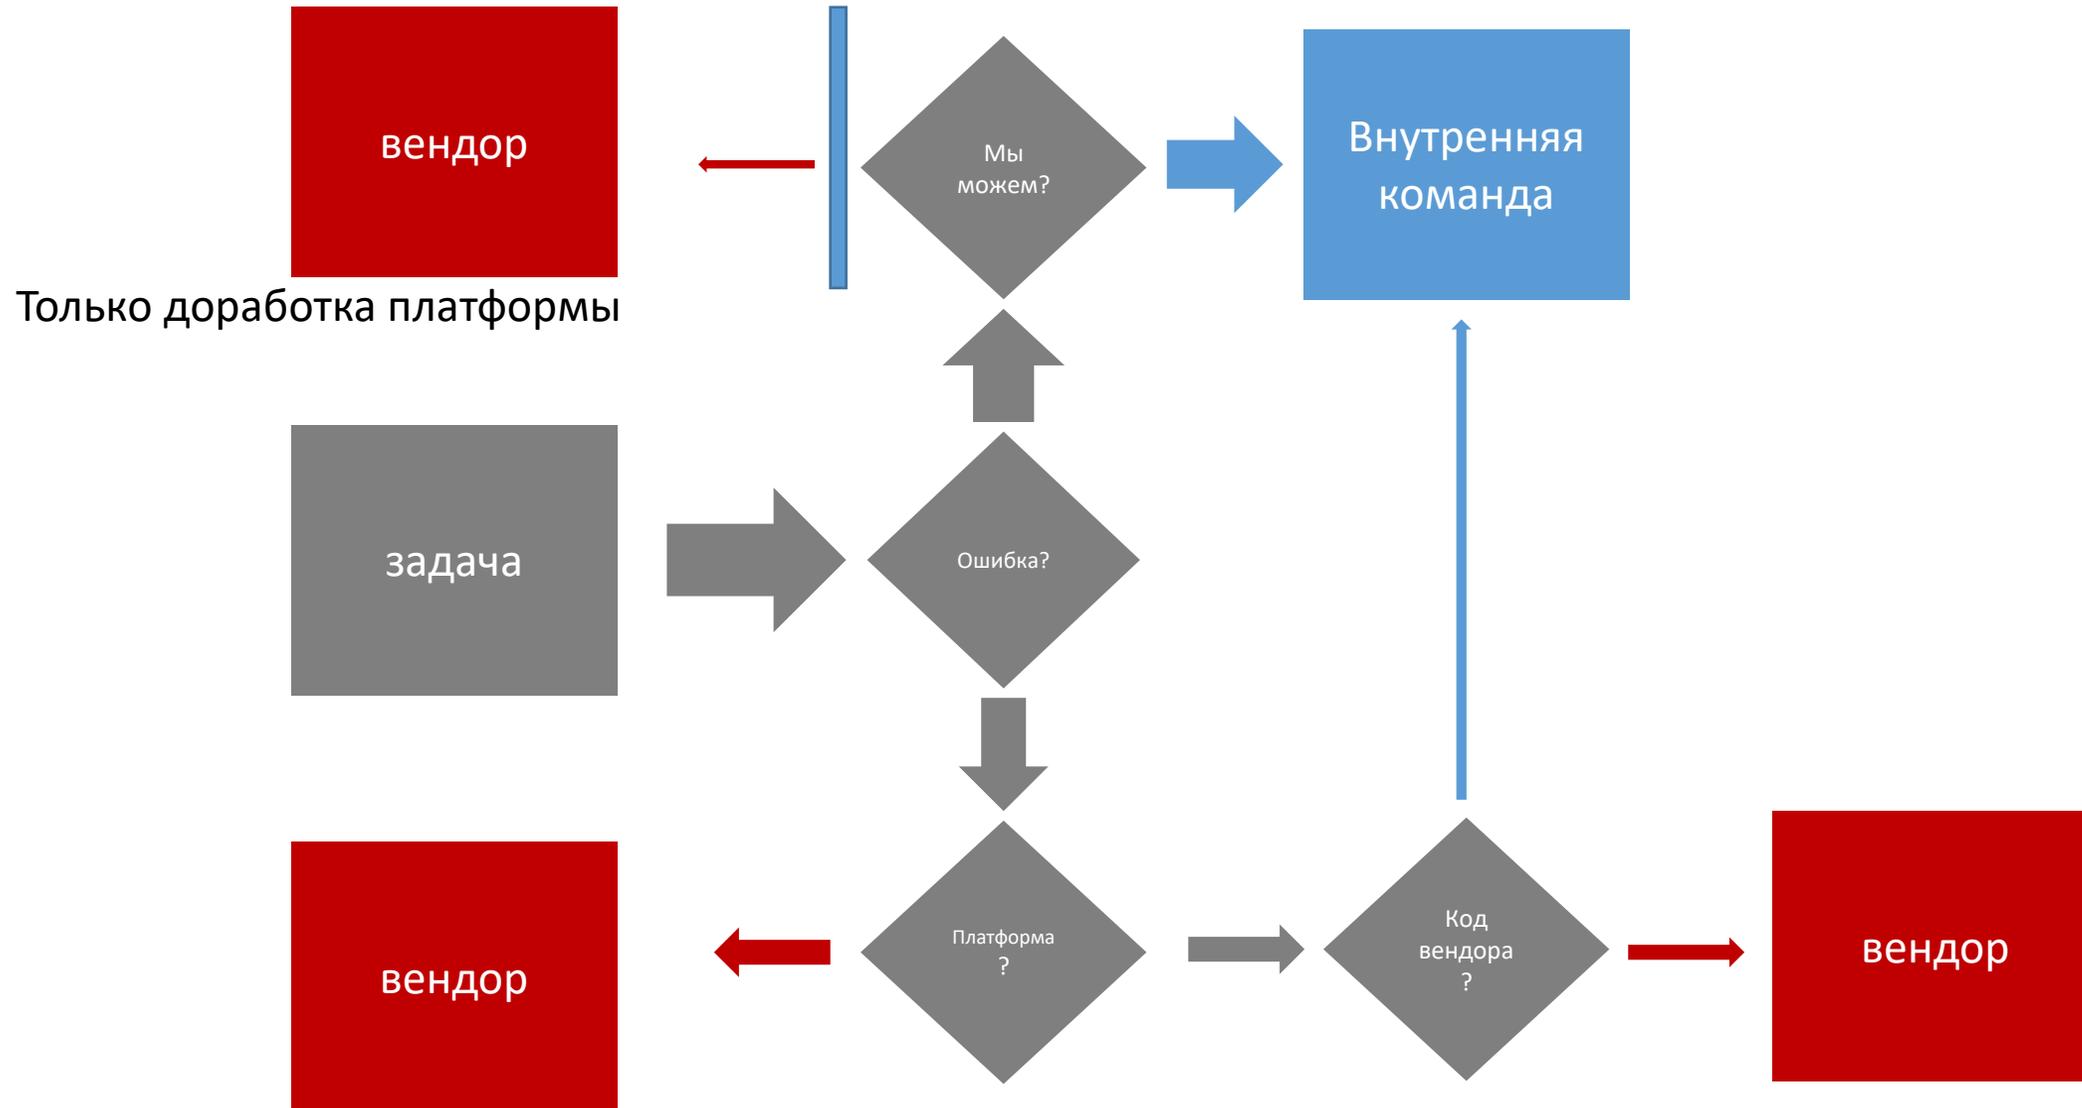

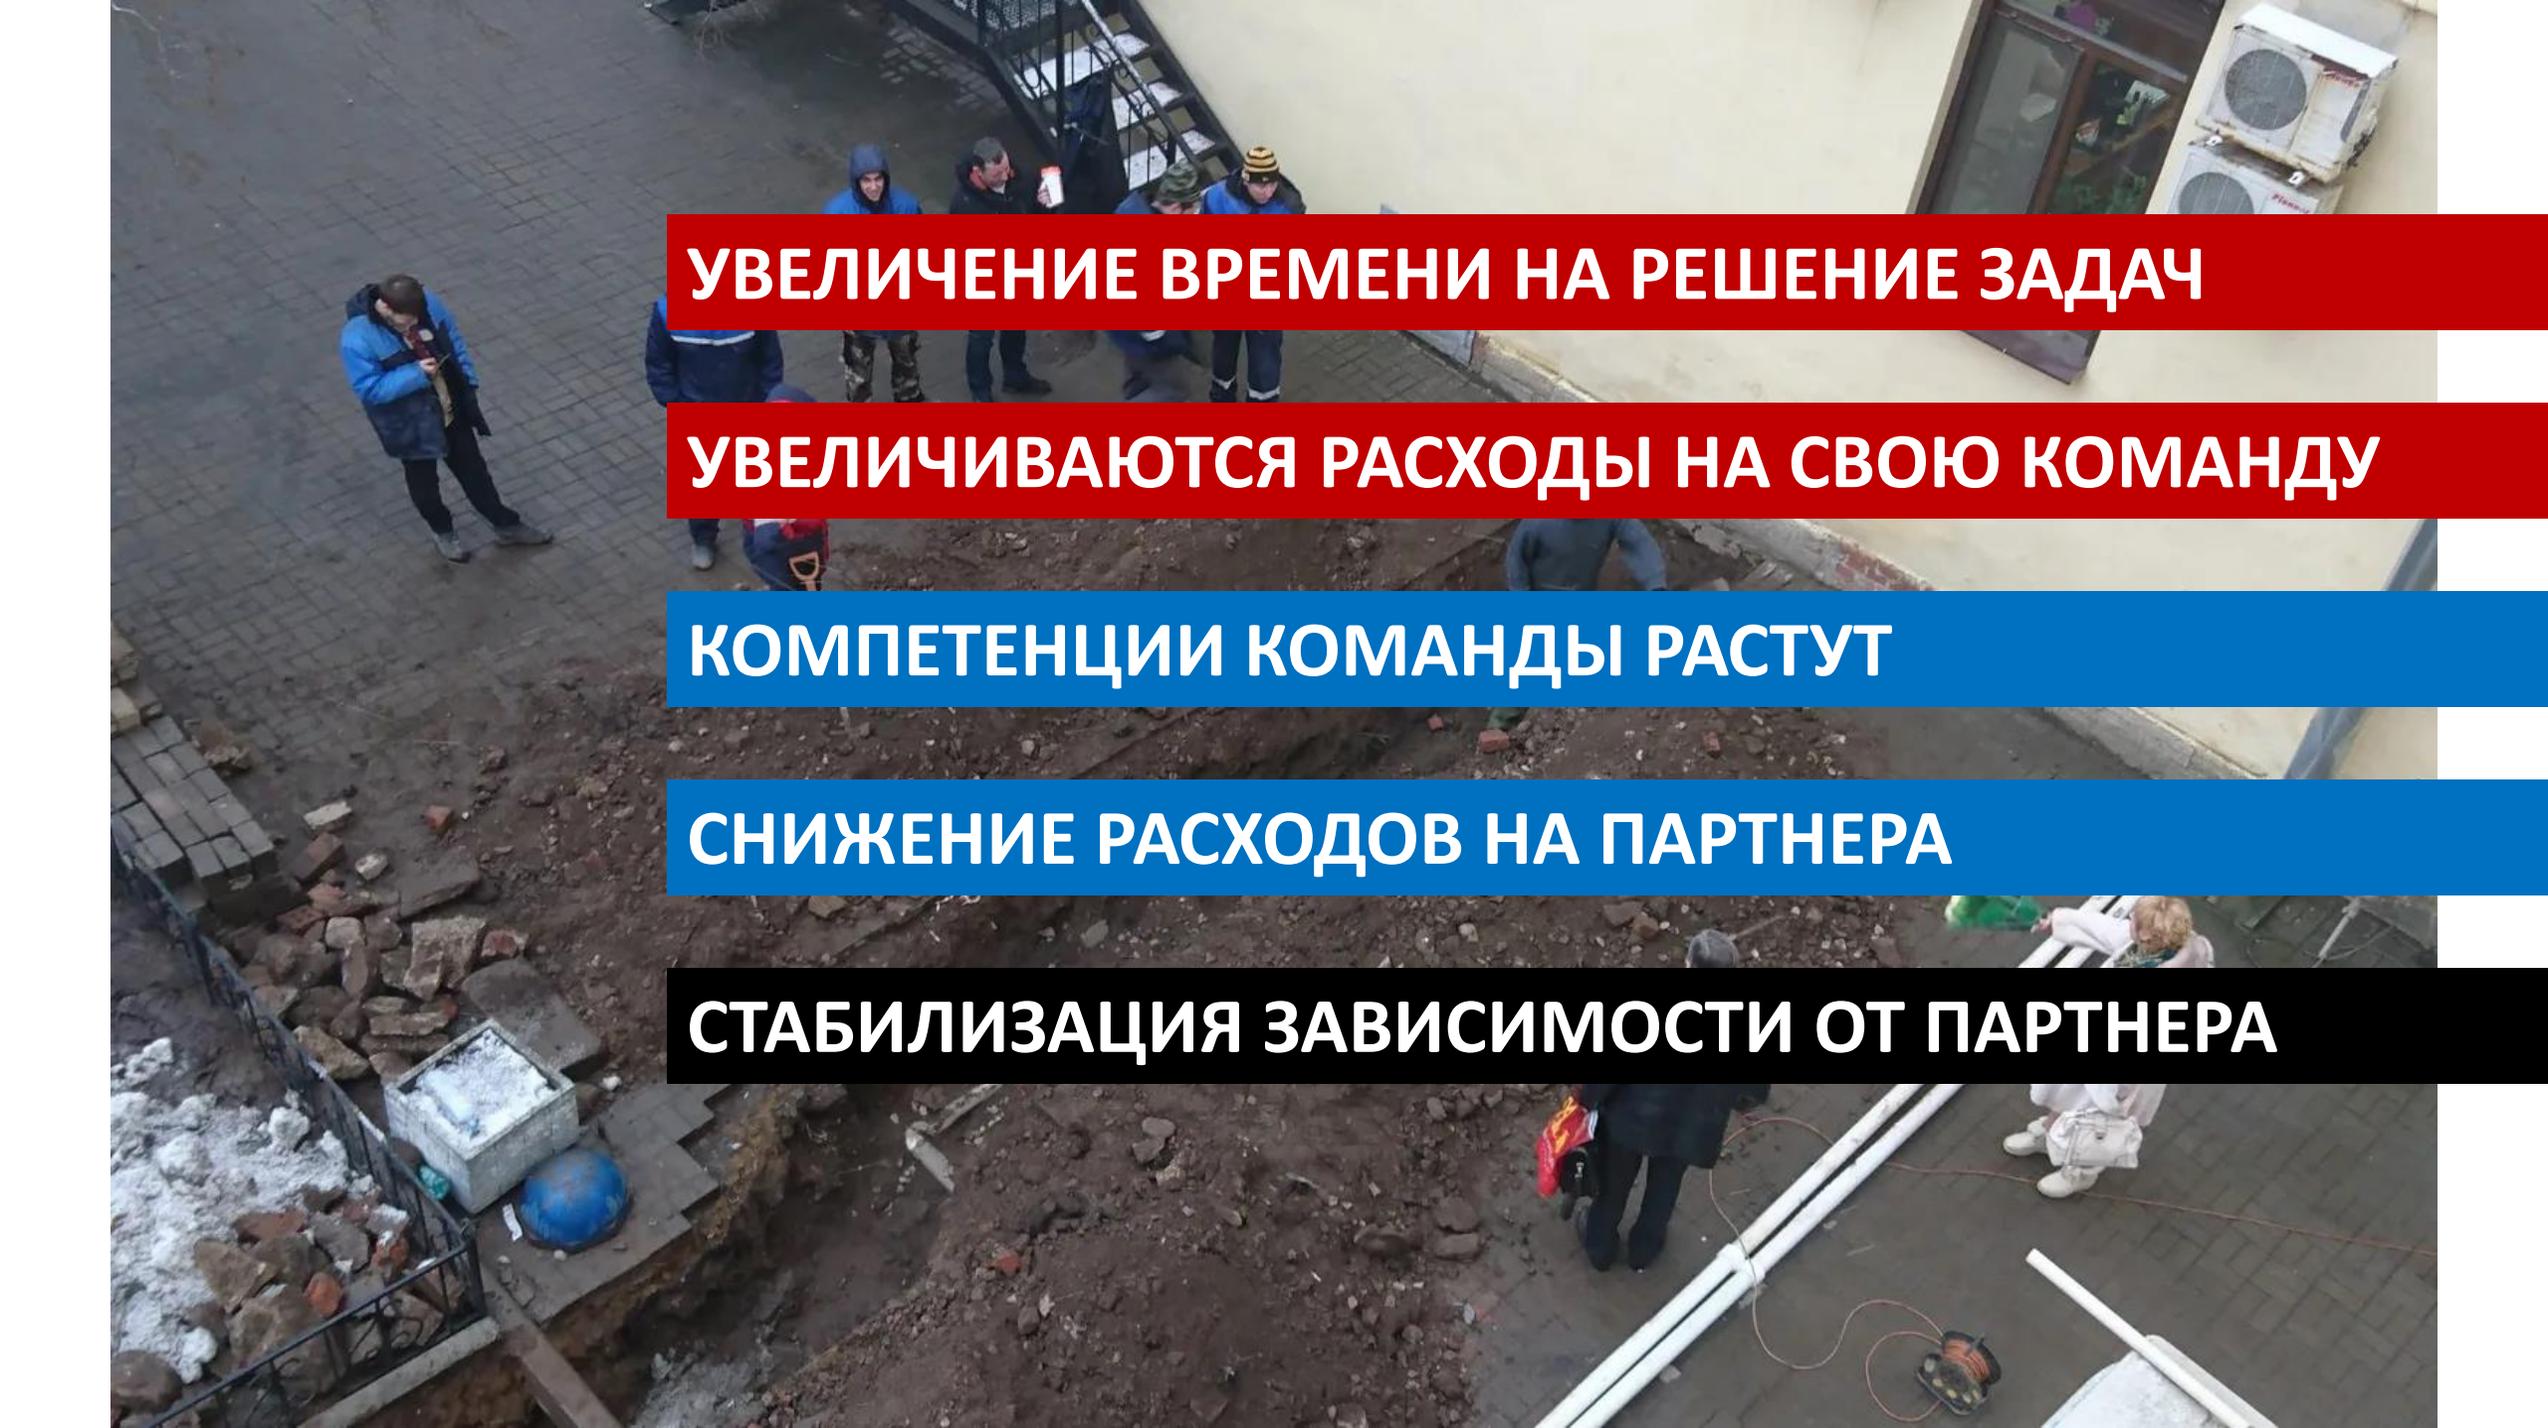An aerial view of a construction site. In the upper part, a group of about six workers in winter clothing are gathered near a building with a staircase. In the lower part, a large pit has been dug into the ground, with some construction materials and a blue gas cylinder nearby. A person in a white coat is visible in the bottom right corner. The ground is a mix of dirt, bricks, and paving stones.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ РАСХОДЫ НА СВОЮ КОМАНДУ

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ РАСТУТ

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА ПАРТНЕРА

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПАРТНЕРА




Конвейер Банковских карт Этап 2


6 КОМАНДА

4 МЕСЯЦЕВ РАЗРАБОТКА

? МЕСЯЦА ОТЛАДКА

Жесткий архитектурный контроль

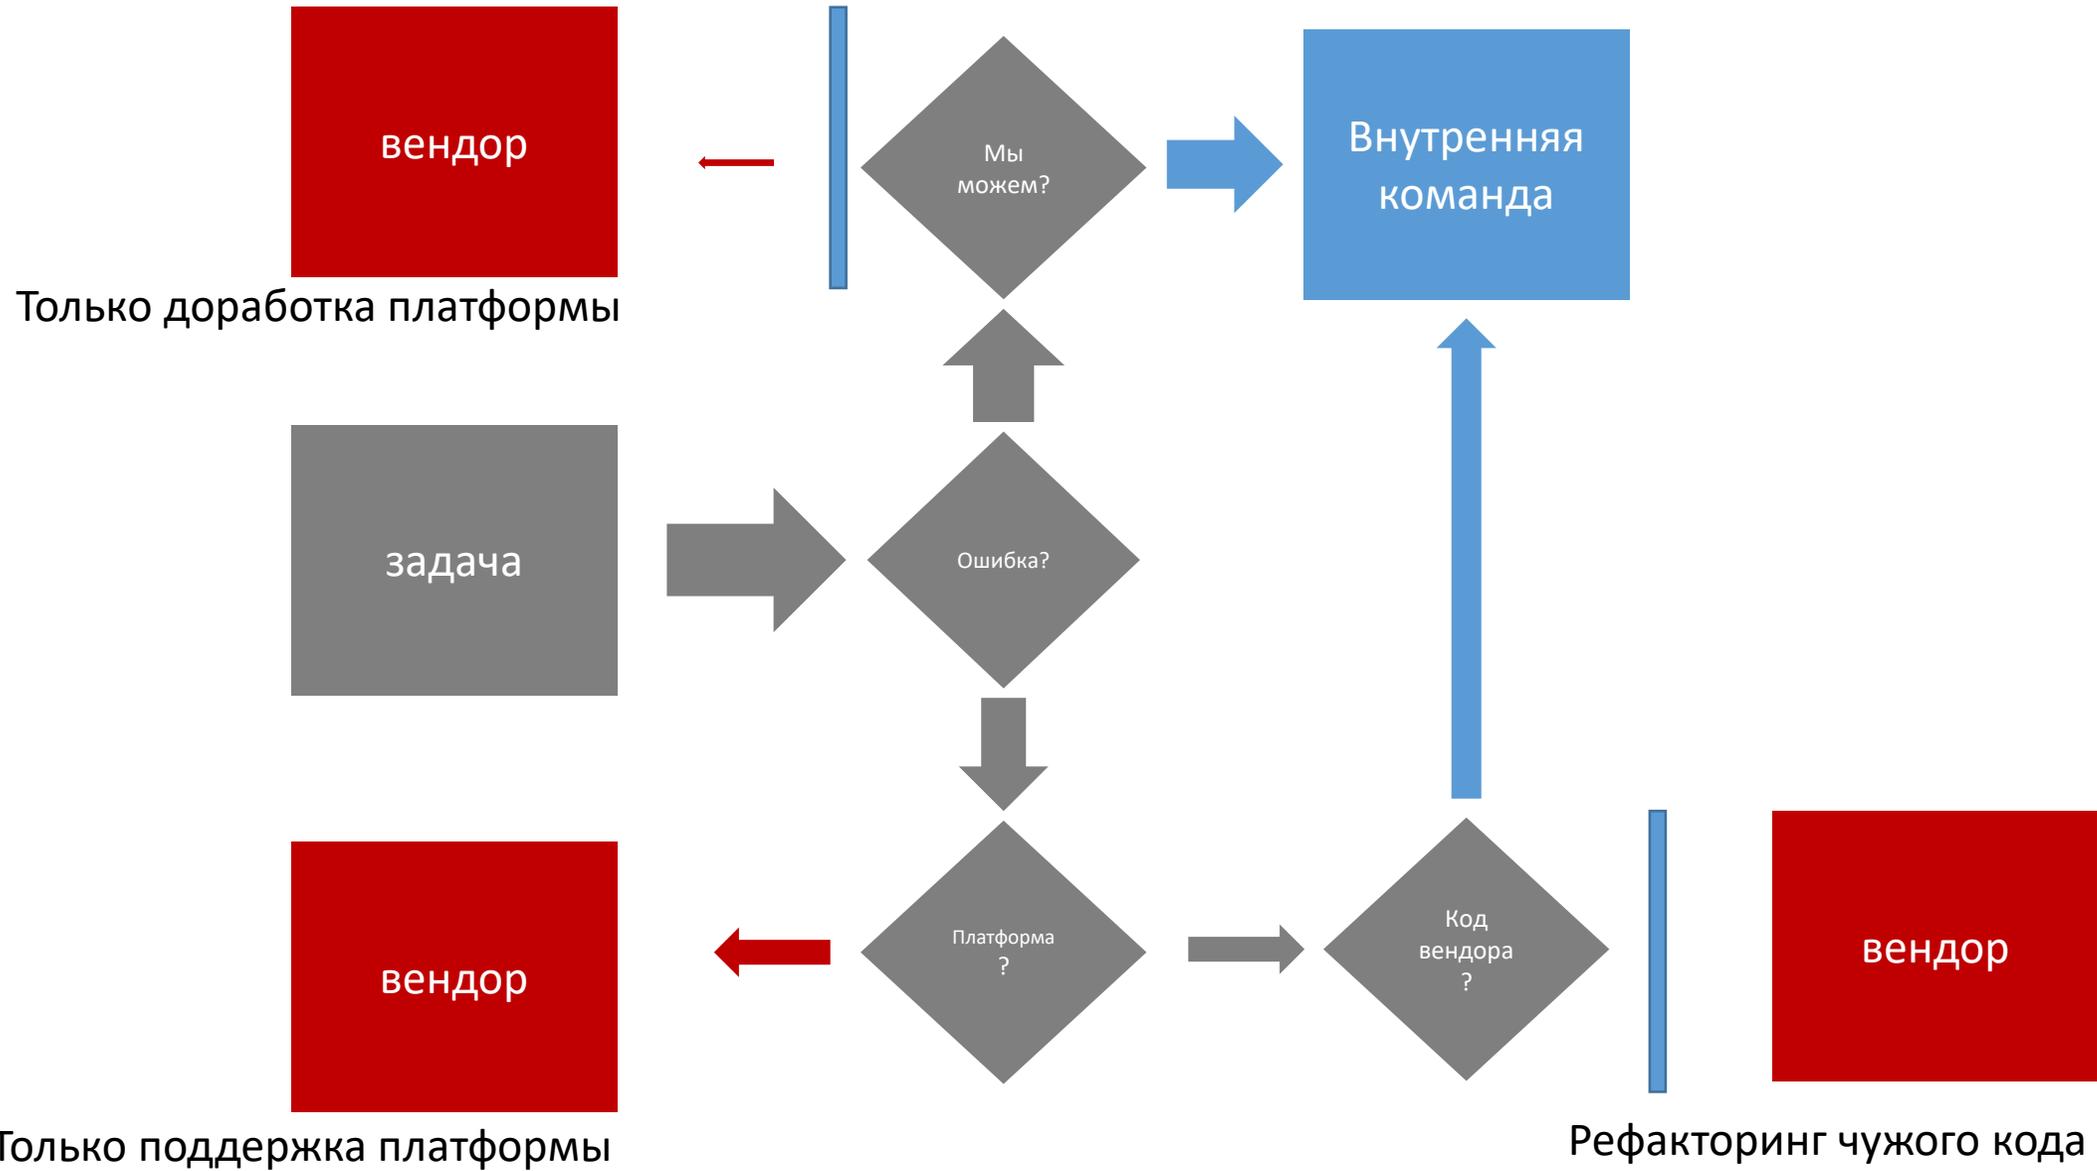

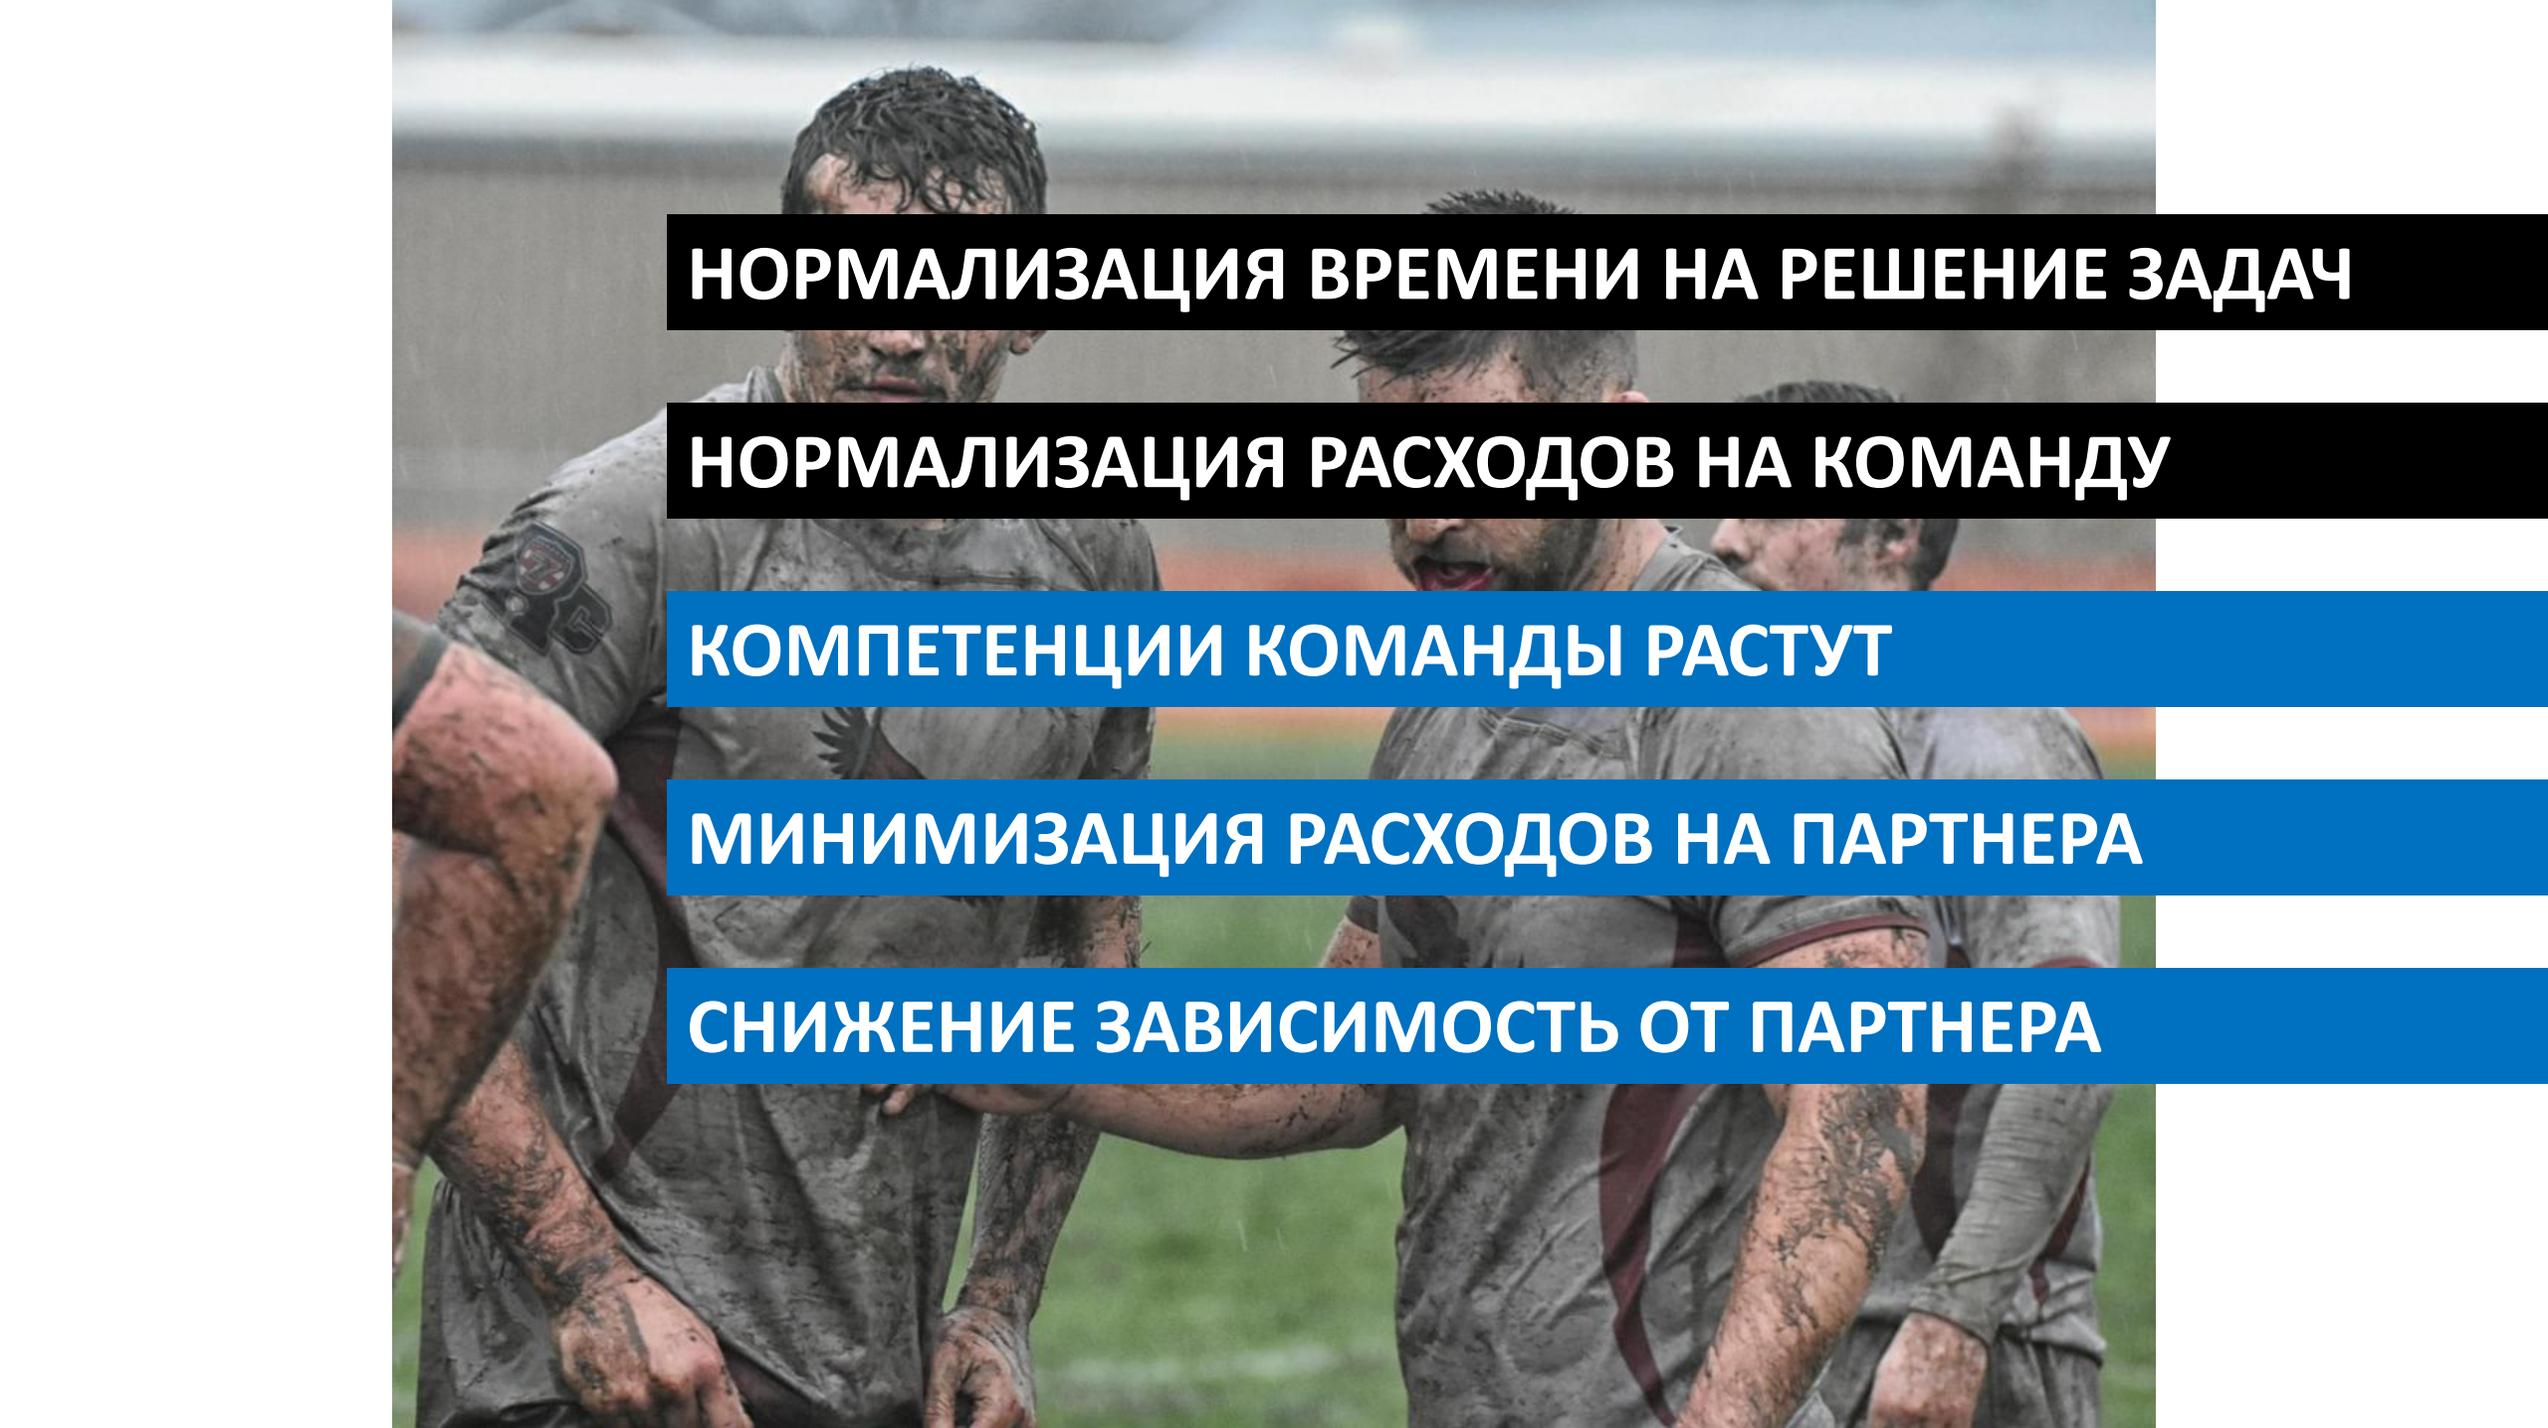

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

НОРМАЛИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА КОМАНДУ

КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДЫ РАСТУТ

МИНИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПАРТНЕРА

СНИЖЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ПАРТНЕРА



РАСЧИТЫВАЙТЕ БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ ИСХОДЯ ИЗ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА С «0»

Вопросы?
